Friheden - hovedtidsplan 01, af 08.09.2014 rev. 09.12.2014

S1-S2-BSB-bilag 10 - Tag, facade og indvendige arbejder samt arbejder i terræn

Etape	Blok nr.	Aktivitet	Antal opgange	Antal etager	Opgangstype	Antal lejemål	Varighed
1-4		Omlægning af kabelskabe(Bygherreleverance)					1 md.
		Affaldsøer					3 md.
		Etablering af hundegård					1 md.
		Fibersystem til ADK (Bygherreleverance)					1 md.
		Fjernvarmestik (anden entreprise)					4 md.
		Etablering af byggeplads N-A og HB					1 md.
1	Blok 7-10	Ledninger i jord mellem blokkene					1 md.
	Blok 7	Etablering af satellitplads					1 uge
	Blok 10	Hvidovre Enghavevej 82-86	3 opgange	3 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	6 md.
	Blok 10	Hvidovre Enghavevej 82-86	3 opgange	3 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	3 md.
	Blok 7	Hvidovre Enghavevej 88-102	8 opgange	4 etager	Type A	3 lejemål pr. etage (2 og 3 værelses lejemål)	12 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 7 (S1)					
	-	Hvidovre Enghavevej 88-102	8 opgange	4 etager	Type A	3 lejemål pr. etage (2 og 3 værelses lejemål)	7 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 7 (S1)					
	Blok 8	Hvidovre Enghavevej 72-80	5 opgange	4 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	7 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 8 (S1)					
	-	Hvidovre Enghavevej 72-80	5 opgange	4 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	4 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 8 (S2)					
	Blok 9	Hvidovre Enghavevej 56-70	8 opgange	4 etager	Type B	3 lejemål pr. etage (1, 3 og 4 værelses lejemå	12 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 9 (S1)					
	-	Hvidovre Enghavevej 56-70	8 opgange	4 etager	Type B	3 lejemål pr. etage (1, 3 og 4 værelses lejemå	7 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 9 (S2)					
	-	Varmecentral i blok 9					1 md.
	Blok 7-10	Aflevering etape 1 - dagbodsbelagt sluttermin					1 dag
	Blok 7	Afrigning af satellitplads					1 uge
2	Blok 11-14	Ledninger i jord mellem blokkene					1 md.
	Blok 14	Etablering af satellitplads ved blok 14					1 uge
	-	Hvidovre Enghavevej 30-44	8 opgange	3 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	11 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 14 (S1)					
	-	Hvidovre Enghavevej 30-44	8 opgange	3 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	6 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 14 (S1)					
	Blok 11	Hvidovre Enghavevej 46-52	4 opgange	4 etager	Type A	3 lejemål pr. etage (2 og 3 værelses lejemål)	6 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 11 (S1)					
	-	Hvidovre Enghavevej 46-52	4 opgange	4 etager	Type A	3 lejemål pr. etage (2 og 3 værelses lejemål)	4 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 11 (S2)					
	Blok 13	Hvidovre Enghavevej 10-14	3 opgange	4 etager	Type B	3 lejemål pr. etage (1, 3 og 4 værelses lejemå	5 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 13 (S1)					
	-	Hvidovre Enghavevej 10-14	3 opgange	4 etager	Type B	3 lejemål pr. etage (1, 3 og 4 værelses lejemå	3 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 13 (S2)					
	Blok 12	Hvidovre Enghavevej 16-28	7 opgange	4 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	11 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 12 (S1)					
	-	Hvidovre Enghavevej 16-28	7 opgange	4 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	6 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 12 (S2)					
	-	Varmecentral i blok 12					1 md.
	Blok 1-2	Ledninger i jord mellem blok 1-2					1 md.
	-	Etablering af satellitplads ved blok 1-2					1 uge
	Blok 1	Hvidovrevej 494-508	8 opgange	4 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	12 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 1 (S1)					
	-	Hvidovrevej 494-508	8 opgange	4 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	7 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 1 (S2)					
	Blok 2	Hvidovrevej 478-492	8 opgange	4 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	12 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 2 (S1)					
	-	Hvidovrevej 478-492	8 opgange	4 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	7 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 2 (S2)					
	Blok 11-14	Aflevering etape 2 - dagbodsbelagt sluttermin					1 dag
		Afrigning af byggeplads N-A					1 md.
		Afrigning af satellitpladser					1 uge
3	Blok 15-18	Ledninger i jord mellem blok 15-18					1 md.
		Etablering af satellitplads ved blok 18					1 uge
	Blok 15	Hvidovrevej 538-550	7 opgange	4 etager	Type A	3 lejemål pr. etage (2 og 3 værelses lejemål)	14 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 15 (S1)					
	-	Hvidovrevej 538-550	7 opgange	4 etager	Type A	3 lejemål pr. etage (2 og 3 værelses lejemål)	6 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 15 (S2)					
	Blok 18	Hvidovrevej 530-536	4 opgange	3 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	6 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 18 (S1)					
	-	Hvidovrevej 530-536	4 opgange	3 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	4 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 18 (S2)					
	Blok 16	Hvidovrevej 512-516	3 opgange	4 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	7 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 16 (S1)					
	-	Hvidovrevej 512-516	3 opgange	4 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	3 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 16 (S2)					
		Varmecentral i jobcenter					1 md.
	Blok 17	Hvidovrevej 518-528	6 opgange	4 etager	Type B	3 lejemål pr. etage (1, 3 og 4 værelses lejemå	8 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 17 (S1)					
	-	Hvidovrevej 518-528	6 opgange	4 etager	Type B	3 lejemål pr. etage (1, 3 og 4 værelses lejemå	5 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 17 (S2)					
	-	Varmecentral i blok 17					1 md.
	Blok 3-5	Ledninger i jord mellem blok 3-5					1 md.
	Blok 3	Hvidovrevej 472-476	3 opgange	4 etager	Type A	3 lejemål pr. etage (2 og 3 værelses lejemål)	7 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 3 (S1)					
	-	Hvidovrevej 472-476	3 opgange	4 etager	Type A	3 lejemål pr. etage (2 og 3 værelses lejemål)	3 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 3 (S2)					
	-	Varmecentral i blok 3					1 md.
	Blok 5	Etablering af satellitplads ved blok 5					1 uge
	Blok 4	Hvidovrevej 456-470	8 opgange	4 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	12 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 4 (S1)					
	-	Hvidovrevej 456-470	8 opgange	4 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	7 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 4 (S2)					
	Blok 5	Hvidovrevej 450-454	3 opgange	4 etager	Type B	3 lejemål pr. etage (1, 3 og 4 værelses lejemå	7 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 5 (S1)					
	-	Hvidovrevej 450-454	3 opgange	4 etager	Type B	3 lejemål pr. etage (1, 3 og 4 værelses lejemå	3 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 5 (S2)					
	Blok 15-18/ Blok 3-5	Aflevering etape 3 - dagbodsbelagt sluttermin					1 dag
		Afrigning af byggeplads HB					1 md.
		Afrigning af satellitpladser					1 uge
4		Etablering af byggeplads N-B					1 md.
	Blok 22	Etablering af satellitplads ved blok 22					1 uge
	-	Strandsmarksvej 60-74	8 opgange	4 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	12 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 22 (S1)					
	-	Strandsmarksvej 60-74	8 opgange	4 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	7 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 22 (S2)					
	Blok 20	Strandsmarksvej 40-52	7 opgange	4 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	11 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 20 (S1)					
	-	Strandsmarksvej 40-52	7 opgange	4 etager	Type C	2 lejemål pr etage (3 værelses lejemål)	
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 20 (S2)	-	-	-	-	6 md.
	Blok 19	Strandsmarksvej 76-82	4 opgange	4 etager	Type A	3 lejemål pr. etage (2 og 3 værelses lejemål)	6 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 19 (S1)					
	-	Strandsmarksvej 76-82	4 opgange	4 etager	Type A	3 lejemål pr. etage (2 og 3 værelses lejemål)	4 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 19 (S2)					
	-	Varmecentral i blok 19					1 md.
	Blok 21	Strandsmarksvej 54-58	3 opgange	4 etager	Type B	3 lejemål pr. etage (1, 3 og 4 værelses lejemå	5 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 21 (S1)					
	-	Strandsmarksvej 54-58	3 opgange	4 etager	Type B	3 lejemål pr. etage (1, 3 og 4 værelses lejemå	3 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 21 (S2)					
	Blok 6	Etablering af satellitplads ved blok 6					1 uge
	-	Strandsmarksvej 4-12	5 opgange	4 etager	Type B	3 lejemål pr. etage (1, 3 og 4 værelses lejemå	7 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 6 (S1)					
	-	Strandsmarksvej 4-12	5 opgange	4 etager	Type B	3 lejemål pr. etage (1, 3 og 4 værelses lejemå	4 md.
	-	Dagbodsbelagt mellemtermin blok 6 (S2)					
	Blok 6	Varmecentral i blok 6					1 md.
		Varmecentral i ejendomskontor					1 md.
		Varmecentraler i butikscenter/højhus					1 md.
	Blok 19-22/ Blok 6	Aflevering etape 4 - dagbodsbelagt sluttermin					1 dag
		Afrigning af byggeplads N-B					1 uge
		Afrigning af satellitpladser					1 uge
1-4		Landskab, terræn, LAR					24 md.
		Aflevering - dagbodsbelagt sluttermin (S1)					1 dag

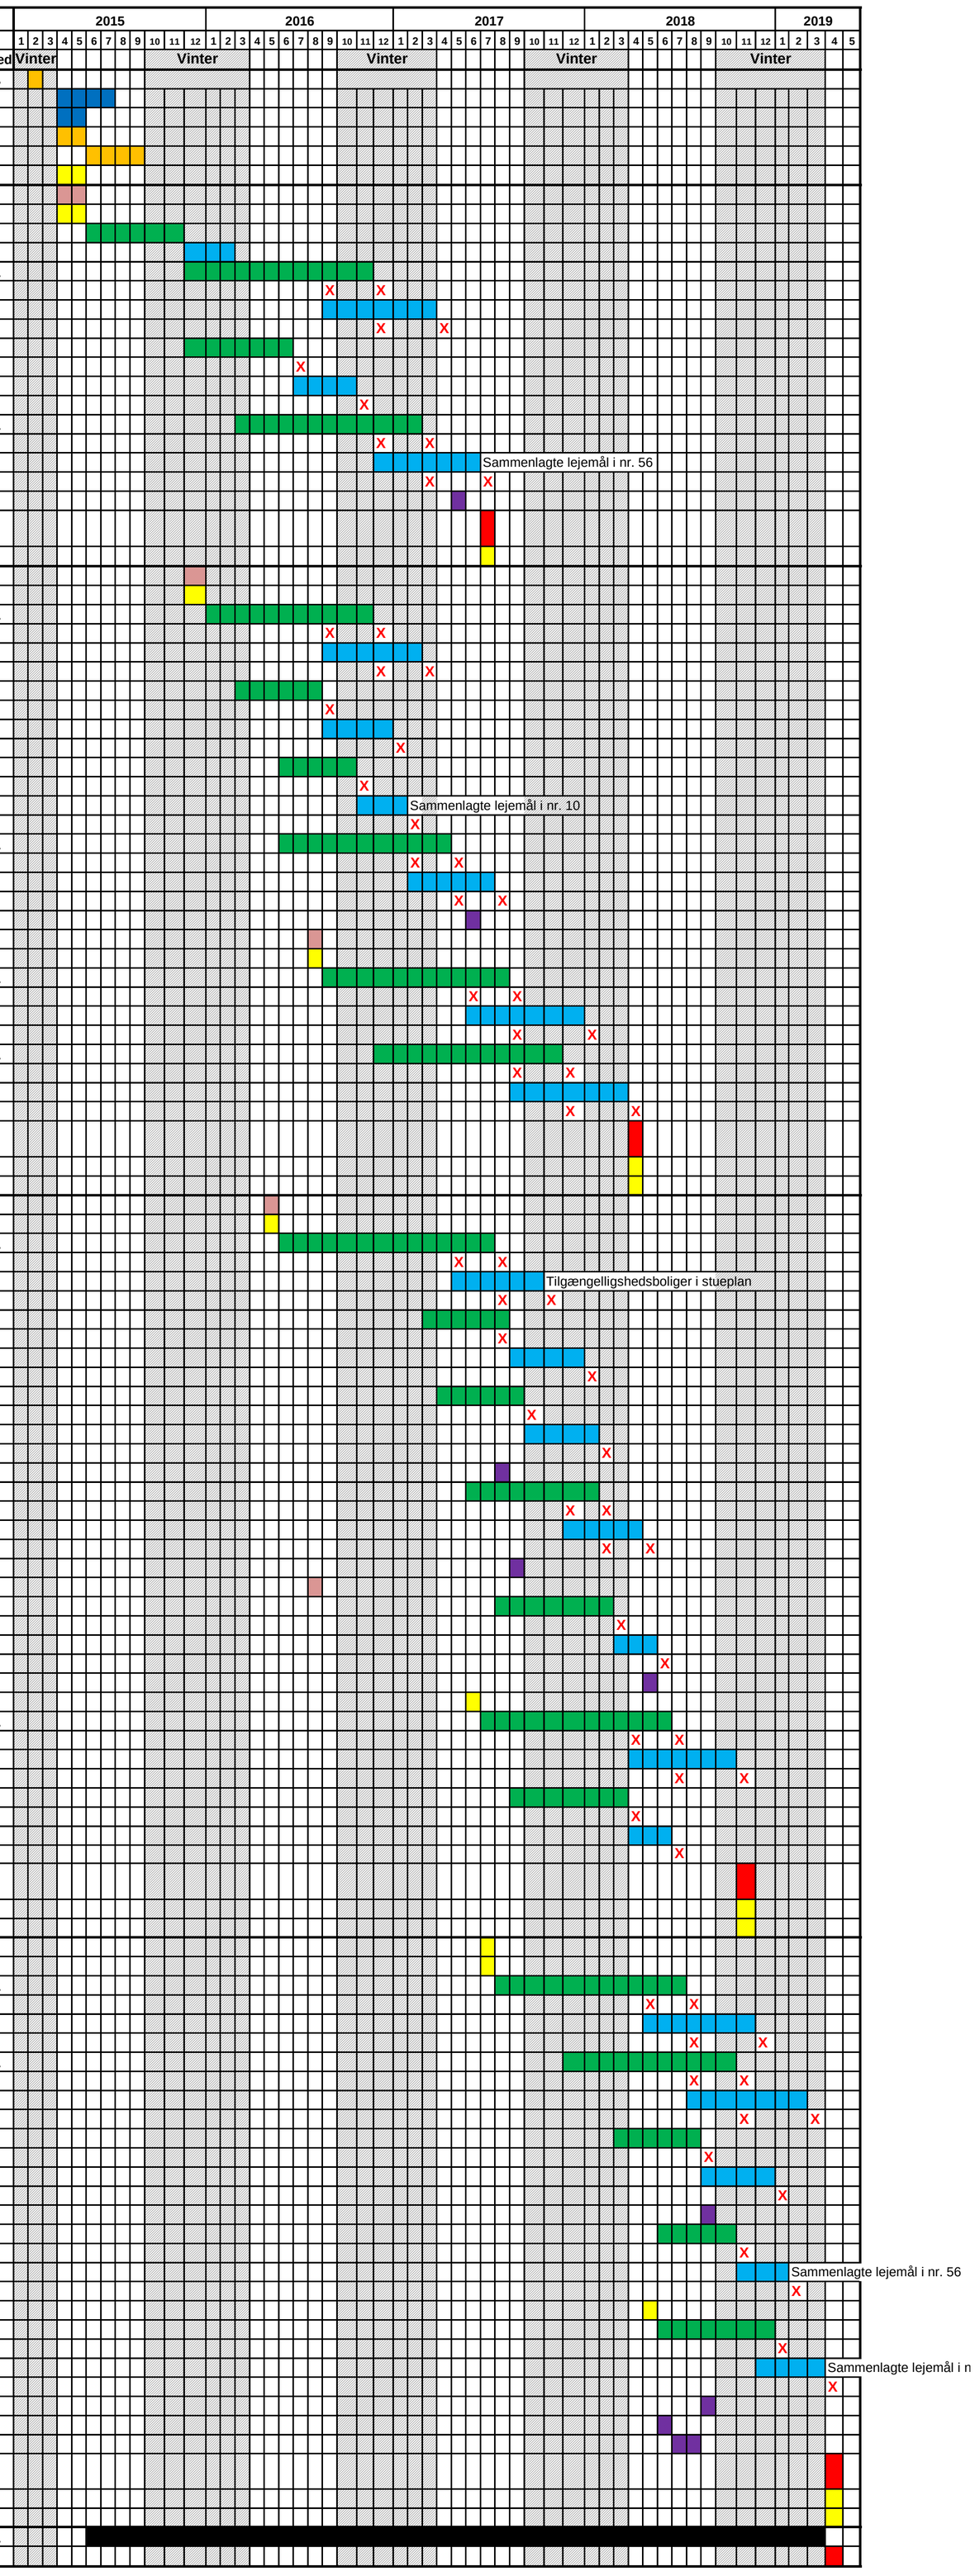

Note:
Blok 10 - øget varighed grundet prøveblok, indkøring
Betonrenovering, opgravning til fundamenter, facadepuds er afhængig af vejret og temperaturen.
Varmecentraler udføres uden for fyringssæson (1. oktober til 30. april)
Varsling af beboerne følger foreningens regler

Byggepladsarbejder (S1/S2) · **Tag og facadearbejder (S1)** · **Indvendige arbejder (S2)**
x **Dagbodsbelagt mellemtermin (S1/S2)** · **Forudgående arbejder (S1)** · **Varmecentral (S2)**
Aflevering - dagbodsbelagt sluttermin (S1/S2) · **Ledninger i jord (S1)**
